



RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE
GESTIONES REALIZADAS.

MAYO 2019 – DICIEMBRE 2019.

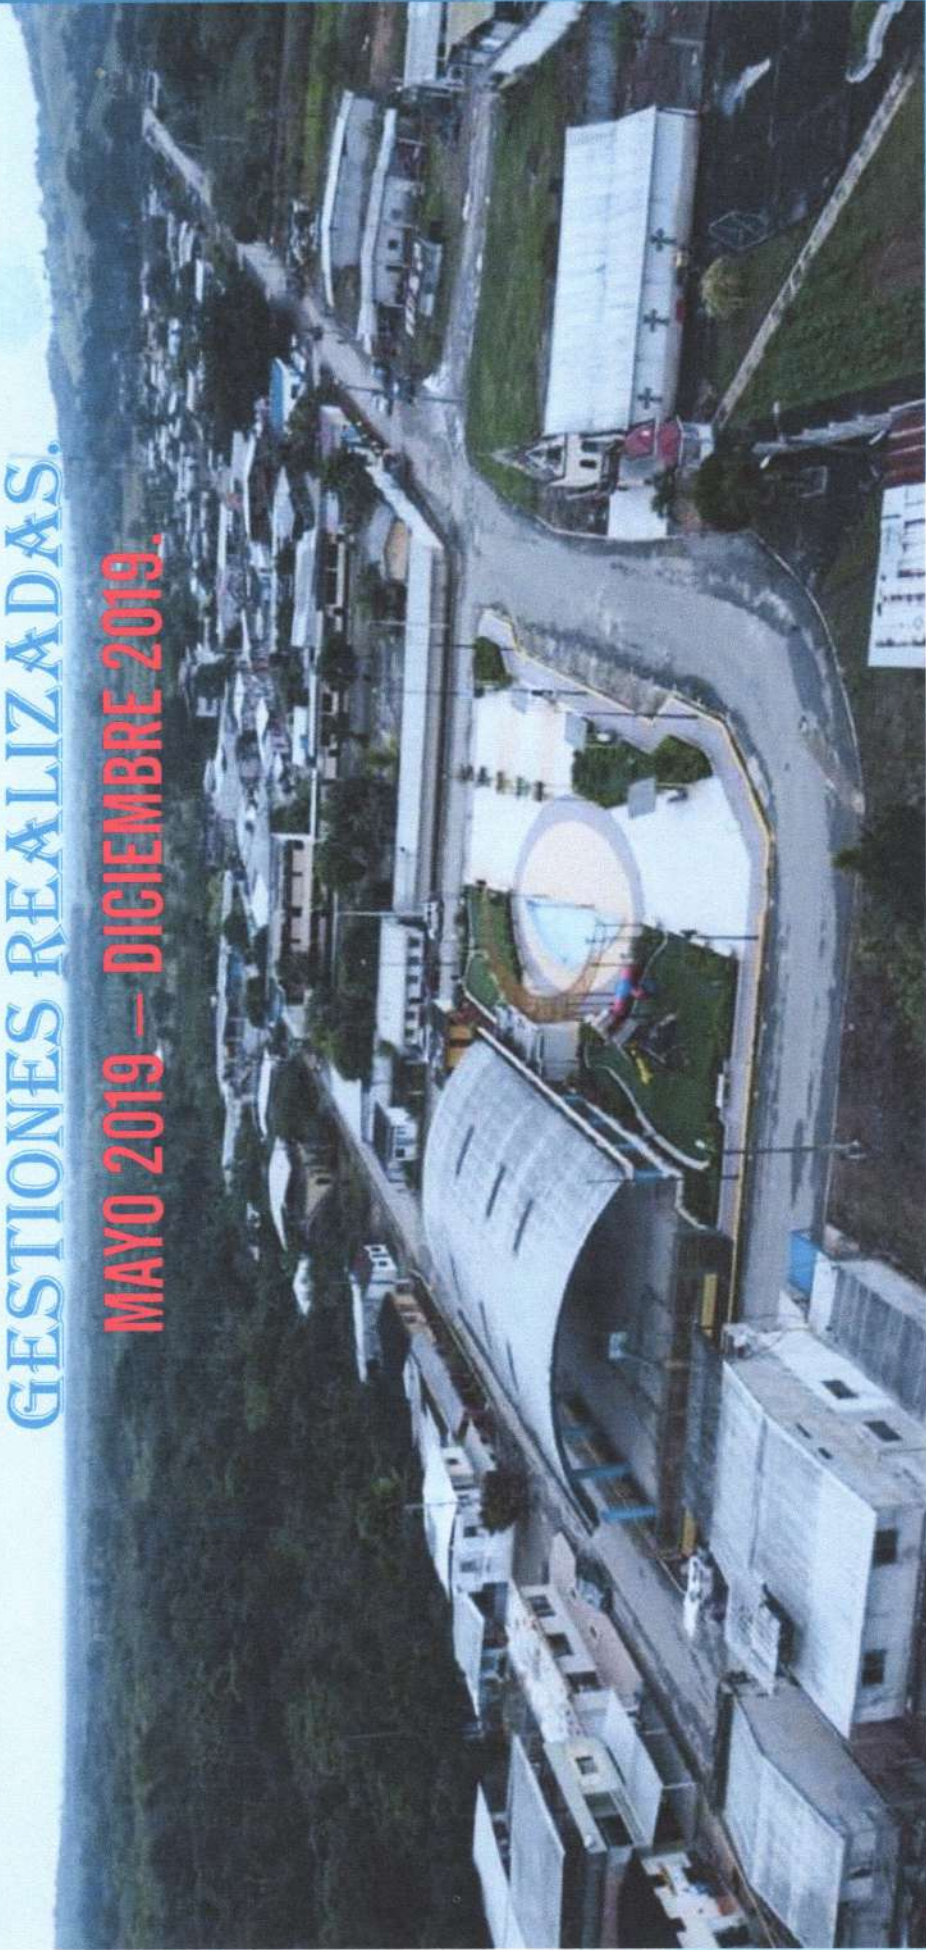



GAD PARROQUIAL RURAL DE
BELLAMARIA

HENRY
GUAMÁN
PRESIDENTE





CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL LA JUNTA PARROQUIAL

CON UN MONTO TOTAL DE \$69.202,56 INCLUIDO IVA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA MARIA



PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA

Obras: "CONSTRUCCION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLA MARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DEL CRO, I ETAPA"

Contratista: QAD Parroquial Rural de Bellamaria

Fiscalizador: Ing. Edinson Cua Garzán

Administrador: Ing. Arturo Carrillo

Fecha de presentación: 29 de Octubre del 2019

Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019

Plazo de ejecución: 90 Días

Monto del contrato: S. 60.019.02

Valor de anticipo: S. 30.009.51

Planilla por (USD): S. 24.254.60

Periodo de ejecución: 26 de Septiembre al 25 de Octubre del 2019

Item	Unidad	CONTRATADO		CANTIDADES EJECUTADAS		COSTO DE LA OBRA		% Avance de obra
		Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Total a la fecha	Total a la fecha	
1	Limpieza - desahogo de la obra	97.66000	2.34735	229.43732	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2	Replanteo y nivelación para construcciones	67.66000	1.51168	147.63067	0.0000	100.4500	151.8500	0.25%
3	Cerramiento provisional (planchas, solados de zinc de 8 pies)	35.00000	16.25711	575.95885	0.0000	12.0000	197.1900	0.13%
4	Demolición de estructuras existentes	30.00000	29.07660	899.02800	0.0000	28.6900	859.7100	1.13%
5	Excavación a máquina para estructuras	86.83900	3.47143	301.52494	0.0000	109.7400	380.9500	0.63%
6	Re-llevo con piedra brava	8.08500	27.84745	225.17663	0.0000	5.1800	144.2500	0.24%
7	Re-llevo compactación con material de excavación	12.70500	6.95984	88.53182	0.0000	13.9400	97.1600	0.16%
8	Re-llevo compactación con material de mejoramiento	39.06400	17.64745	689.37999	0.0000	15.6700	276.5400	0.46%
9	Desahogo de material de excavación y escombros	74.15400	3.66005	276.57655	0.0000	124.4900	430.7400	0.72%
10	Hormigón simple f'c=180 Kg/cm², replantación	1.74200	173.30292	301.87309	0.0000	1.5800	271.8200	0.46%
11	Hormigón simple f'c=210 Kg/cm², plintos	4.33500	180.09520	794.14475	0.0000	6.7600	1217.1800	2.03%
12	Hormigón simple f'c=210 Kg/cm², muelcos	4.55000	241.16325	109.52346	0.0000	0.4300	103.7000	0.17%
13	Hormigón simple f'c=210 Kg/cm², rostreros	7.26000	201.98325	1466.36840	0.0000	8.3800	1692.6700	2.82%
14	Hormigón simple f'c=210 Kg/cm², columnas	3.25500	241.16325	784.96348	0.0000	3.2500	783.7400	1.31%
15	Hormigón simple f'c=210 Kg/cm², vigas	5.33750	251.87207	1344.36717	0.0000	6.6300	1669.9100	2.78%
16	Losa alivianada f'c=210 Kg/cm², c=20cm.	112.16660	89.18860	10003.95202	0.0000	98.5200	8786.3600	14.14%
17	Hormigón armado f'c=210 Kg/cm², contrapiso a=11cm	97.66000	32.77488	3200.78478	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
18	Misuras de hormigón armado f'c=210 Kg/cm²	0.00000	81.31921	73.18729	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
19	Acero de refuerzo en barras f'c=4200 Kg/cm²	26.78.02236	2.43371	6517.52980	0.0000	2353.2600	7187.3800	11.98%
20	Impermeabilización de bioque macizo a=7 cm	177.84000	14.56813	2590.76624	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
21	Enlucido vertical 1:3	398.49000	9.39684	3744.54677	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
22	Enlucido horizontal 1:3	112.16660	10.23190	1147.67743	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
23	Fijon	250.50000	5.77285	1446.06893	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
24	Prevolante en lincada	67.50000	36.44980	2460.36150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
25	Prevolante en plin	97.66000	35.68380	3465.93387	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
26	Cerámico en paredes de baños	34.50000	32.68492	1122.67884	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
27	Recubrimiento de granito en muros	0.90000	138.61212	124.75091	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
28	Etapate	450.58660	4.65745	2098.54456	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
29	Primera de latex	21.77000	92.16460	2003.17784	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
30	Puerta leñada	1.00000	1778.30904	1778.30904	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
31	Vereta de la abertura de vidrio templado 2.0x2.00m	8.00000	247.5452	1972.25616	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
32	Vereta de madera (varas modulas)	1.313	1291.97768	1707.97768	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
33	Ventanas de aluminio y vidrio	25.00000	13.48804	337.20100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
34	Alumbrado eléctrico	1.00000	218.47704	218.47704	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
35	Caja de brakers (16 unidades)	1.00000	218.47704	218.47704	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA

Obra: CONSTRUCCION DE LA RUTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL CRO, IETAPA

Contratista: UAD Parroquial Rural de Bellamaria

Fecha de presentacion: 29 de Octubre del 2019

Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019

Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019

Administrador: Ing. Edison Cua Guzmán

Plazo de ejecucion: 90 Dias


Monto del contrato: 5.60.019'02


Valor de anticipo: 5.30.005'51

Planilla por (USD): 5.24.254'06

Periodo de ejecucion: 26 de Septiembre al 22 de Octubre del 2019

Item	Rubros	CONTRATADO			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Total a la fecha	Este periodo	Total anterior	Total a la fecha			
30	Traslapamientos de cable polarizado 1 lts	pto	16	60.000	34,376.01	343,769.15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
37	Traslapamientos polarizado 220v	pto	4	60.000	60,709.64	242,838.56	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
38	Tramos de al	pto	15	60.000	34,131.62	512,274.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
39	Plano de t	pto	4	60.000	30,762.82	123,051.28	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
40	Plano de telefonia	pto	3	60.000	29,396.83	89,690.49	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
41	de alambre	u	4	60.000	147,312.39	589,249.56	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
42	de varillones	u	3	60.000	109,154.52	327,463.56	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
43	Clave de paso: contadora 0.12" (red white)	u	3	60.000	28,087.65	84,262.95	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
44	Clave para livianas	u	3	60.000	35,216.80	105,650.40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
45	Tramos de agua potable	pto	7	60.000	33,016.90	231,668.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
46	Plano de agua servida	pto	3	60.000	34,685.27	242,79,689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
47	Plano de revoque	u	3	60.000	94,243.52	282,724.56	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
48	Plano de instalacion de tuberia PVC 0.4"	ml	20	60.000	10,214.90	204,298.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
49	Traslap en vado 100v ll	u	1	60.000	284,411.04	284,411.04	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	
VALOR TOTAL CANTIDAD AVANADO (USD)						60013.02							
VALOR PLANILLADO													
IVA													
TOTAL SUMAN													
DESC. ANTICIPO													
DESC. IVA													
DESC. IMP. RENTA													
RETRASO													
SALDO EQUIBO A PAGARSE:													


 Ing. Edison Cua Guzman
 INGENIERO
 ADMINISTRADOR


 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA
 INGENIERO
 ADMINISTRADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



PLANILLA No. 2 DE AVANCE DE OBRA

Obra: "CONSTRUCCION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, ECUADOR"

Contratante: GAD Parroquial Rural de Bellamaria
 Contratista: Construcciones Faux Coferm C.a. Ltda.
 Fiscalizador: Ing. Edson Cua Guernas
 Administrador: Ing. Arturo Carrillo

Fecha de presentación: 26 de Noviembre del 2019
 Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019
 Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019
 Plazo de ejecución: 90 Días

Monto del contrato: \$ 60,019.02
 Valor de anticipo 1: \$ 30,009.51
 Planilla por (USD): \$ 9,276.40
 Periodo de ejecución: 26 de Octubre al 24 de Noviembre del 2019

Item	Bases	CONTRATADO			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra	
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo		Total a la fecha
42	Lavativas	u	3,000	109,1545	327,4636	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
43	1/2"lave para lavamanos	u	3,000	28,0377	84,2630	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
44	1/2"lave para lavamanos	u	3,000	35,2168	105,6504	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
45	Puentes de agua potable	pts	7,000	33,0869	231,6083	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
46	Puentes de agua potable	pts	7,000	34,6853	242,7969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
47	Puentes de agua potable	u	3,000	94,2415	282,7246	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
48	Puentes de agua potable de tubería PVC O 4"	u	20,000	10,2149	204,2980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
49	1/2" agua elevada 1060 h	u	1,000	244,4110	244,4110	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
VALOR TOTAL CONTRATADO (USD)					60019,02							55,87%
VALOR PLANILLADO					9276,40							
IVA					113,17							
TOTAL SUMAN					10389,57							
DESC. ANTICIPO					4638,20							
DESC. IVA					333,95							
DESC. IMP. RENTA					92,76							
RETENIDO					0,00							
SALIDO LIQUIDO A PAGARSE:					13921,80							19246,46


 ARTURO CARRILLO
 ADMINISTRADOR
 CONSTRUCIONES FAUX COFERM C.A. LTDA.
 CONTRATISTA

MON: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 66/100 DOLARES AMERICANOS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

PLANILLA No. 3 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

Monto del contrato: \$ 69,019.02
 Valor de anticipo: \$ 30,069.51
 Planilla por (USD): \$ 28,237.69
 Período de ejecución: 25 de Noviembre al 24 de Diciembre del 2019

Fecha de presentación: 26 de Noviembre del 2019
 Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019
 Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019
 Plazo de ejecución: 90 Días

Obra: "CONSTRUCCION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL OCHO, LETAPA"
 Contratista: GAD Parroquial Rural de Bellamaria
 Contratistas: Contrataciones Ferns Coffeats Cia. Ltda.
 Diseñador: Ing. Edinson Cua Guzmán
 Administrador: Ing. Arturo Carrillo

Item	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra
					Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	
1	m2	97.6660	2.3424	229.4375	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2	m2	97.6660	1.3117	128.1177	100.4500	0.0000	100.4500	0.0000	0.0000	100.4500	151.8756
3	m3	35.0000	16.4871	577.0585	12.6000	0.0000	12.6000	0.0000	0.0000	12.6000	197.4790
4	m3	30.0000	29.9776	899.0289	28.6000	0.0000	28.6000	0.0000	0.0000	28.6000	859.7759
5	m3	86.8390	3.4734	300.1529	109.7400	0.0000	109.7400	0.0000	0.0000	109.7400	380.9550
6	m3	8.0850	27.8434	225.1466	5.1800	0.0000	5.1800	0.0000	0.0000	5.1800	144.2560
7	m3	12.7010	6.2093	78.8518	13.9400	0.0000	13.9400	0.0000	0.0000	13.9400	97.1600
8	m3	39.0640	17.6478	689.3800	15.6700	0.0000	15.6700	0.0000	0.0000	15.6700	276.3400
9	m3	74.1540	17.0478	1263.5766	124.4900	0.0000	124.4900	0.0000	0.0000	124.4900	430.7400
10	m3	1.7420	173.1079	301.8937	1.5800	0.0000	1.5800	0.0000	0.0000	1.5800	273.8200
11	m3	4.3520	333.0562	1448.4488	6.4300	0.0000	6.4300	0.0000	0.0000	6.4300	1217.1800
12	m3	7.8500	201.9533	1585.2333	8.3800	0.0000	8.3800	0.0000	0.0000	8.3800	103.7000
13	m3	7.8500	201.9533	1585.2333	8.3800	0.0000	8.3800	0.0000	0.0000	8.3800	103.7000
14	m3	3.3500	251.1633	841.3971	3.6100	0.0000	3.6100	0.0000	0.0000	3.6100	870.6000
15	m3	112.1666	89.1886	10003.9820	98.5200	0.0000	98.5200	0.0000	0.0000	98.5200	1717.7700
16	m2	97.6660	32.7749	3200.7948	85.4400	85.2900	170.7300	280.2900	279.3700	595.6600	8786.8600
17	m2	97.6660	81.3192	7931.873	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
18	m2	2678.0324	2.4337	6517.5298	2953.2600	0.0000	2953.2600	7187.3800	0.0000	7187.3800	11.98%
19	kg	177.8400	14.5681	2580.7962	177.4700	0.0000	177.4700	2385.4100	0.0000	2385.4100	4.31%
20	m2	398.4900	9.3068	3744.5468	301.7900	0.0000	301.7900	2835.8700	0.0000	2835.8700	1.53%
21	m2	112.1666	10.2310	1147.6774	89.9400	0.0000	89.9400	920.1500	0.0000	920.1500	3.03%
22	m2	250.5000	5.7729	1446.0289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
23	m2	67.5000	36.4498	2460.3615	0.0000	45.3600	45.3600	0.0000	1820.9900	1820.9900	2.78%
24	m2	97.6660	32.4849	3163.9319	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
25	m2	34.5000	32.4849	1122.7308	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
26	m2	450.5866	4.6575	2098.5846	0.0000	29.533000	29.533000	0.0000	124.7500	154.2830	0.21%
27	m2	21.7700	92.0146	2003.1578	0.0000	32.233000	32.233000	0.0000	1375.4800	1700.7130	2.29%
28	m2	1.0000	1778.3090	1778.3090	0.0000	10.8500	10.8500	0.0000	182.0000	192.8500	3.04%
29	m	8.0000	247.1545	1977.2362	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	998.3100	999.3100	2.96%
30	m	15.3600	84.1131	1291.9777	0.0000	8.0000	8.0000	0.0000	1977.2362	1977.2362	3.29%
31	m	25.0000	13.4860	337.1500	0.0000	20.0000	20.0000	0.0000	1291.9777	1291.9777	2.15%
32	m	1.0000	218.4770	218.4770	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	209.7600	210.7600	0.45%
33	m	10.0000	34.3769	343.7690	0.0000	10.0000	10.0000	0.0000	318.4800	328.4800	0.46%
34	m	4.0000	60.7096	242.8386	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	242.8386	242.8386	0.35%
35	m	15.0000	3.11516	46.7274	0.0000	15.0000	15.0000	0.0000	512.2700	512.2700	0.74%
36	m	4.0000	29.7628	119.0512	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
37	m	3.0000	30.0000	90.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
38	m	4.0000	29.7628	119.0512	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
39	m	3.0000	30.0000	90.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
40	m	4.0000	147.3124	589.2496	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	589.2496	589.2496	0.86%
41	m	4.0000	147.3124	589.2496	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	589.2496	589.2496	0.86%



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA




PLANILLA No. 3 DE LIQUIDACION DE OBRA


Obra: "CONSTRUCCION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, IETAPA"

Contratante: GAD Parroquial Rural de Bellamaria
Fecha de presentación: 26 de Noviembre del 2019
Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019
Contratador: Ing. Edinson Cua Guzman
Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019
Administrador: Ing. Arturo Carrillo
Plazo de ejecución: 90 Dias

Monto del contrato: \$ 62,019.02
Valor de anticipo: \$ 39,069.51
Planilla por (USD): \$ 28,257.66
Periodo de ejecución: 25 de Noviembre al 24 de Diciembre del 2019

Item	Rubros	CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo		Total a la fecha	
42	Lavamanos	u	3.0000	109.1545	327.4636	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	327.4636	327.4636	0.53%	
43	Llave de paso cortadora 0 1/2" (red white)	u	3.0000	28.0877	84.2631	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	28.0877	28.0877	0.05%	
44	Llave para lavamanos	u	3.0000	35.2168	105.6504	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	105.6504	105.6504	0.18%	
45	Puertas de agua potable	plu	7.0000	33.0869	231.6083	0.0000	7.0000	7.0000	0.0000	231.6083	231.6083	0.37%	
46	Puertas de agua servida	plu	7.0000	34.6853	242.7969	0.0000	7.0000	7.0000	0.0000	242.7969	242.7969	0.40%	
47	Puercos de revisione	u	3.0000	94.2415	282.7246	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	188.4892	188.4892	0.31%	
48	Provisione e instalacione de tuberia PVC 0 4"	ml	20.0000	10.2149	204.2980	0.0000	24.1000	24.1000	0.0000	246.1950	246.1950	0.41%	
49	Tanque elevado 1000 l	u	1.0000	284.4110	284.4110	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	284.4110	284.4110	0.47%	
VALOR TOTAL CONTRATO (USD)					60019.0177								
50	Bajas metalicas	m2	11.5200	98.8300	1138.5216	0.0000	11.5200	11.5200	0.0000	1138.5216	1138.5216	1.90%	
RUBRO NI ENO (COSTO MAS PORCENTAJE)													
VALOR PLANILLADO													
IVA													
TOTAL SUMAN													
DESC. ANTICIPO													
DESC. IVA													
DESC. IMP. RENTA													
RETRASO													
SALDO LIQUIDO A PAGARSE:													


 EDINSON CUA GUZMAN
 FISCALIZADOR


 ARTURO CARRILLO
 ADMINISTRADOR

COPISTAS LTDA
 CONTRATISTA


SON: DIECISIETE MIL CIENTO CUATRO CON 35/100 DOLARES AMERICANOS



PROYECTO ADULTO MAYOR

CON UN GASTO TOTAL DE \$13.771,97 INCLUIDO IVA Y 50 BENEFICIADOS.



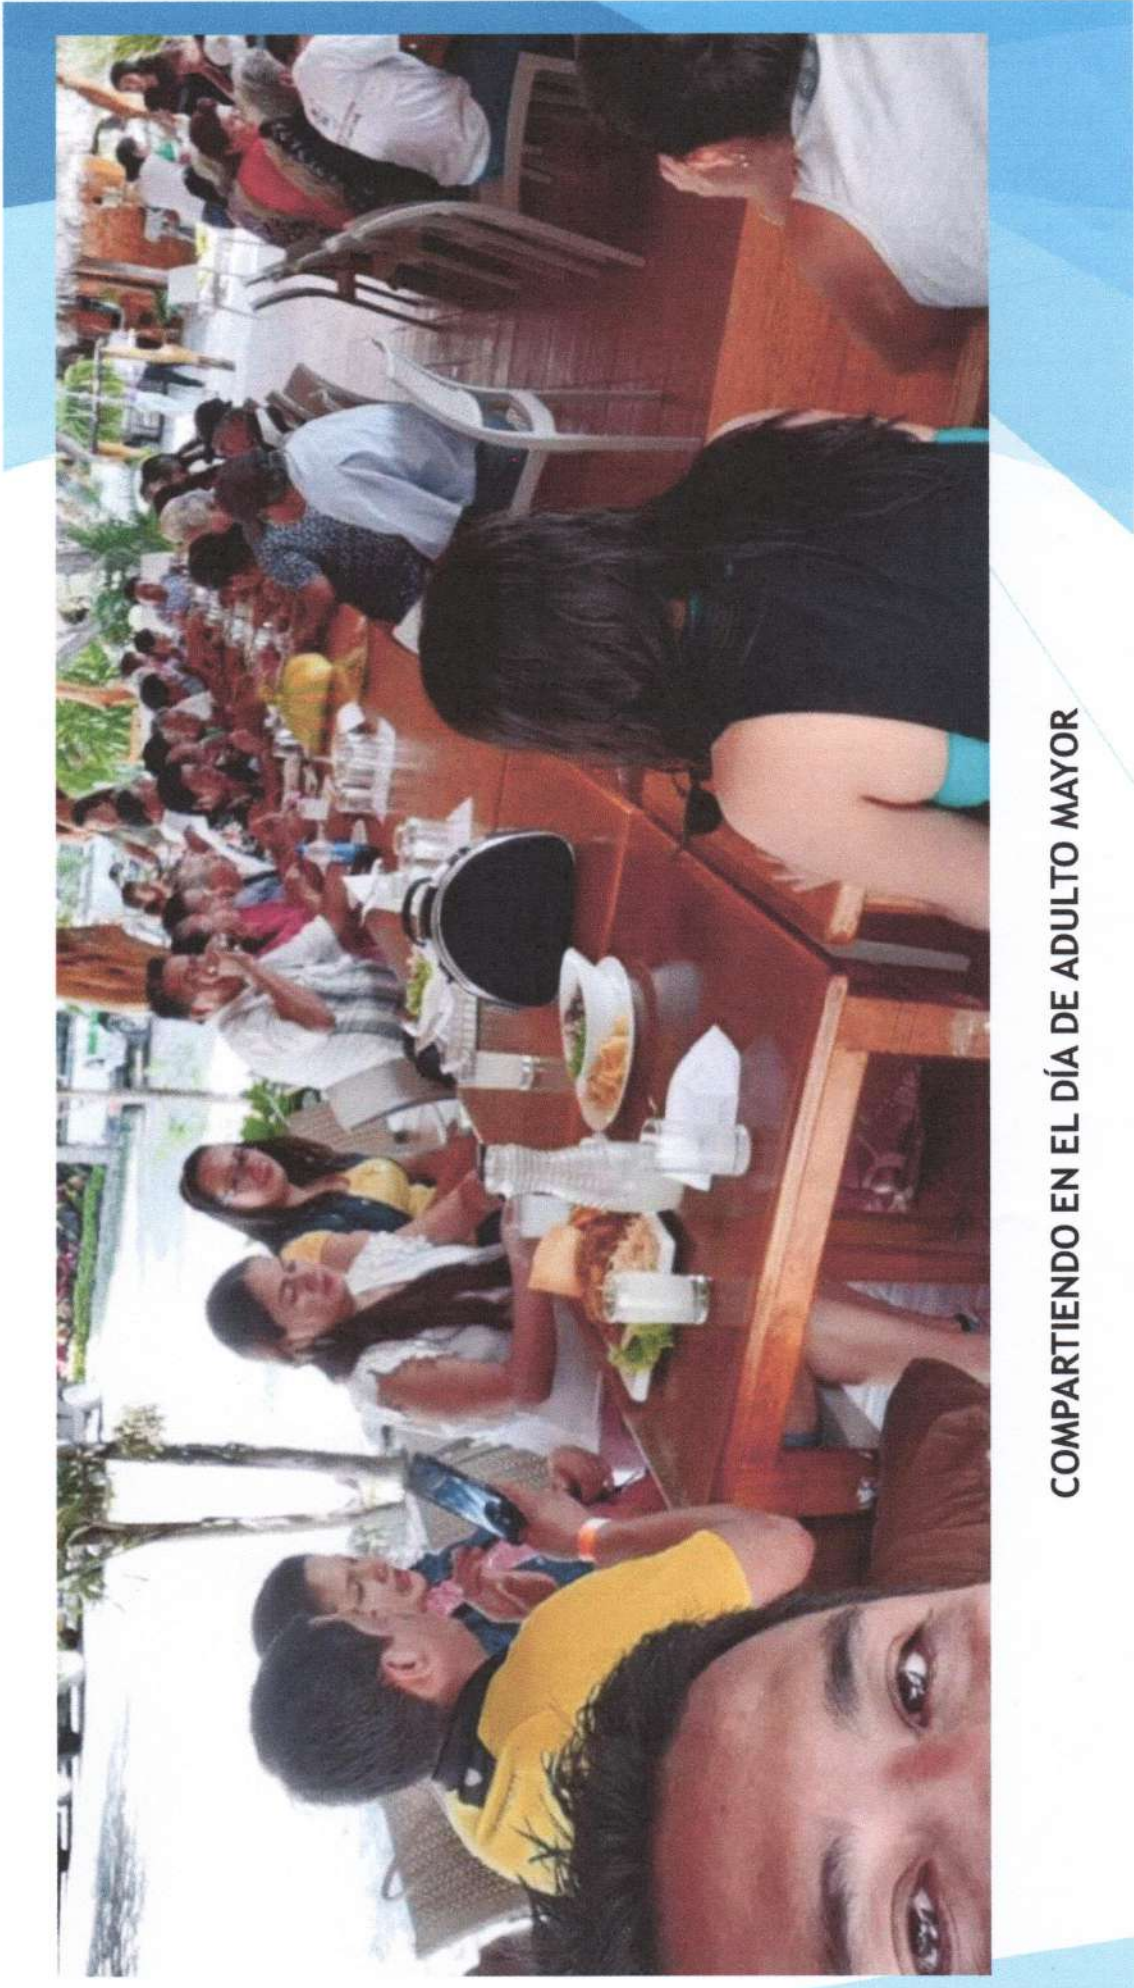


COMPARTIENDO EN EL DÍA DE ADULTO MAYOR



PROYECTO DISCAPACIDAD

GASTOS EN CONVENIO: GAD.P.R DE BELLAMARIA \$4.95,51 - MIES \$11.648,03
TOTAL: \$16.602,54 INCLUIDO IVA - 30 BENEFICIARIOS

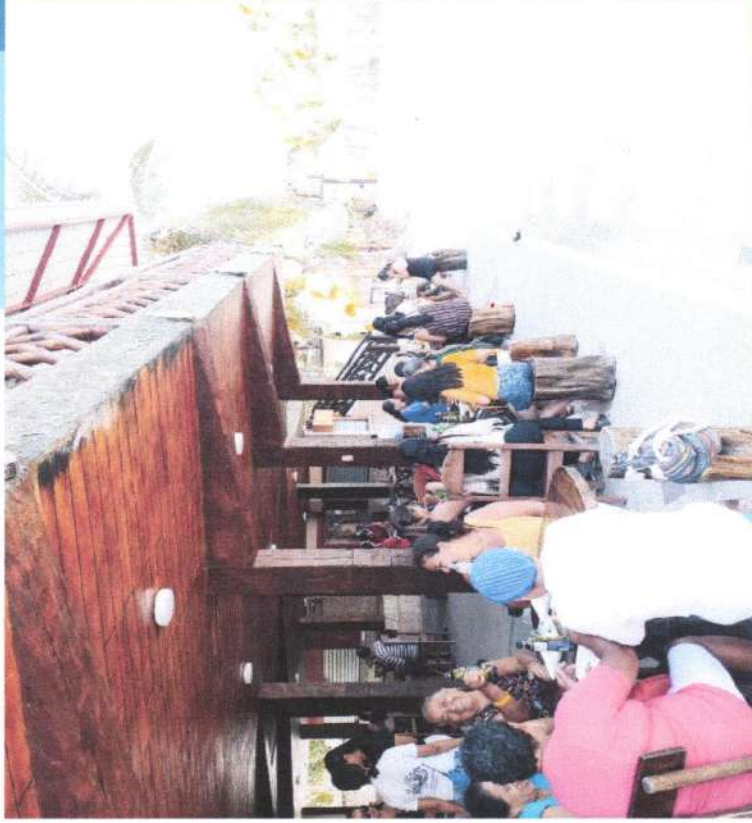

**COMPARTIENDO CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON CAPACIDADES ESPECIALES**



PROYECTO INOCENTRO

GASTO TOTAL GAD. P.R DE BELLAMARIA \$49,76 INCLUIDO IVA



ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSO REALIZADO EN EL INFOCENTRO DE BELLAMARIA.



PROYECTO MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES

GASTO TOTAL GAD DE BELLAMARIA \$ 6.460,72 INCLUIDO IVA



FIRMA DE CONVENIO CON ALCALDÍA Y PREFECTURA PARA EL ASFALTO DE ALREDEDOR DE LAS CALLES DEL PARQUE DEL SITIO VALLE HERMOSO.



GESTIÓN ANTE LA ALCALDIA PARA CONSEGUIR MATERIAL PETREO, CEMENTO Y CONCRETERA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO VADEN CON AYUDA DE LOS MORADORES DEL SITIO PIRIGUÑA QUIENES TRABAJARON EN MINGAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO.





GESTIÓN DE MATERIAL PETREO Y MAQUINARIA PARA EL LASTRADO DE LA VÍA PIEDRA REDONDA.

Bellamaría

Parroquia próspera.

EL GAD Parroquial de Bellamaría hace una cordial invitación a todas las personas colaboradoras de nuestra Parroquia a ser partícipes de una gran minga para realizar el pintado de bordillos de la cabecera Parroquial.

Miércoles 17 de julio a las 15 horas (3:00 pm)
Concentración en las afueras del GAD.

FECHA Y HORA



ABG. HENRY GUAMÁN
PRESIDENTE

MINGA DE MORADORES PARA PINTADOS DE BORDILLOS DE LA CABECERA PARROQUIAL.





**ADECENTAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONABAN LA CASA PARROQUIAL TANTO
COMO EL POLI DEPORTIVO, OBRA REALIZADA MEDIANTE GESTIÓN ANTE LA EMPRESA
PRIVADA Y MORADORES DEL SITIO QUIENES COLABORARON EN MINGAS.**



**GESTIÓN EN EL BDE PARA LA ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO NO REEMBOLSABLE QUE NO SE A
PODIDO CONSEGUIR EN LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.**



Que, la evaluación de la presente asignación fue realizada en la parte técnica por la Coordinación de Evaluación de la Sucursal Zonal Litoral del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; y, en la parte legal, por la Coordinación Jurídica de la Sucursal Zonal Litoral;

VISTO: El Informe de Asignación No. BDE-I-CER2G-2019-0307-M, de 16 de octubre de 2019, que cuenta con el pronunciamiento favorable de las Coordinaciones de Evaluación y Jurídica; y,

En ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias y las establecidas en la Resolución No. 2014-DIR-009, de 31 de enero de 2014.

DECIDE:

Art. 1.- Conceder una asignación, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaría, hasta por USD. 56.083,22 (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES CON 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), destinado a financiar el proyecto: "Construcción de la Junta Parroquial de la parroquia Bellamaría, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro".

Art.2.- La operación se concede bajo el siguiente perfil financiero:

OPERADOR DE LA ASIGNACIÓN:

Sucursal Zonal Litoral;

ASIGNATARIO/BENEFICIARIO:

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaría;

PROVINCIA:

El Oro;

CANTON:

Santa Rosa;

OBJETO:

Financiar la construcción de la Junta Parroquial de la parroquia Bellamaría, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro";

SECTOR:

Desarrollo humano;

PROYECTO:

"Construcción de la Junta Parroquial de la parroquia Bellamaría, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro";

PROGRAMA:

Producto BDE-GAD Parroquiales Rurales/BDE - GADPR;

FONDO:

PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - ASIG NR. MF;

VALOR DE LA DE ASIGNACIÓN:

USD. 56.788,19 Asignación con MET (sin deducir el 2% de comisión del BDE);

CUPO DE ENDEUDAMIENTO:

No registra en el sistema cupo de endeudamiento;




GESTIÓN ANTE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CANTONAL PARA QUE SE REALICEN ELECCIONES Y CONFORMACIÓN DE COMITE BARRIAL DEL SITIO BIRON.



GESTIÓN ANTE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CANTONAL PARA QUE SE REALICEN ELECCIONES Y CONFORMACIÓN DE COMITE BARRIAL DEL SITIO SAN CARLOS.



**PRESIDENTE DE LAS JUNTAS PARROQUIALES DEL CANTÓN SANTA ROSA
MIEMBRO DEL COMITE DE PLANIFICACIÓN DEL GAD CANTONAL.**

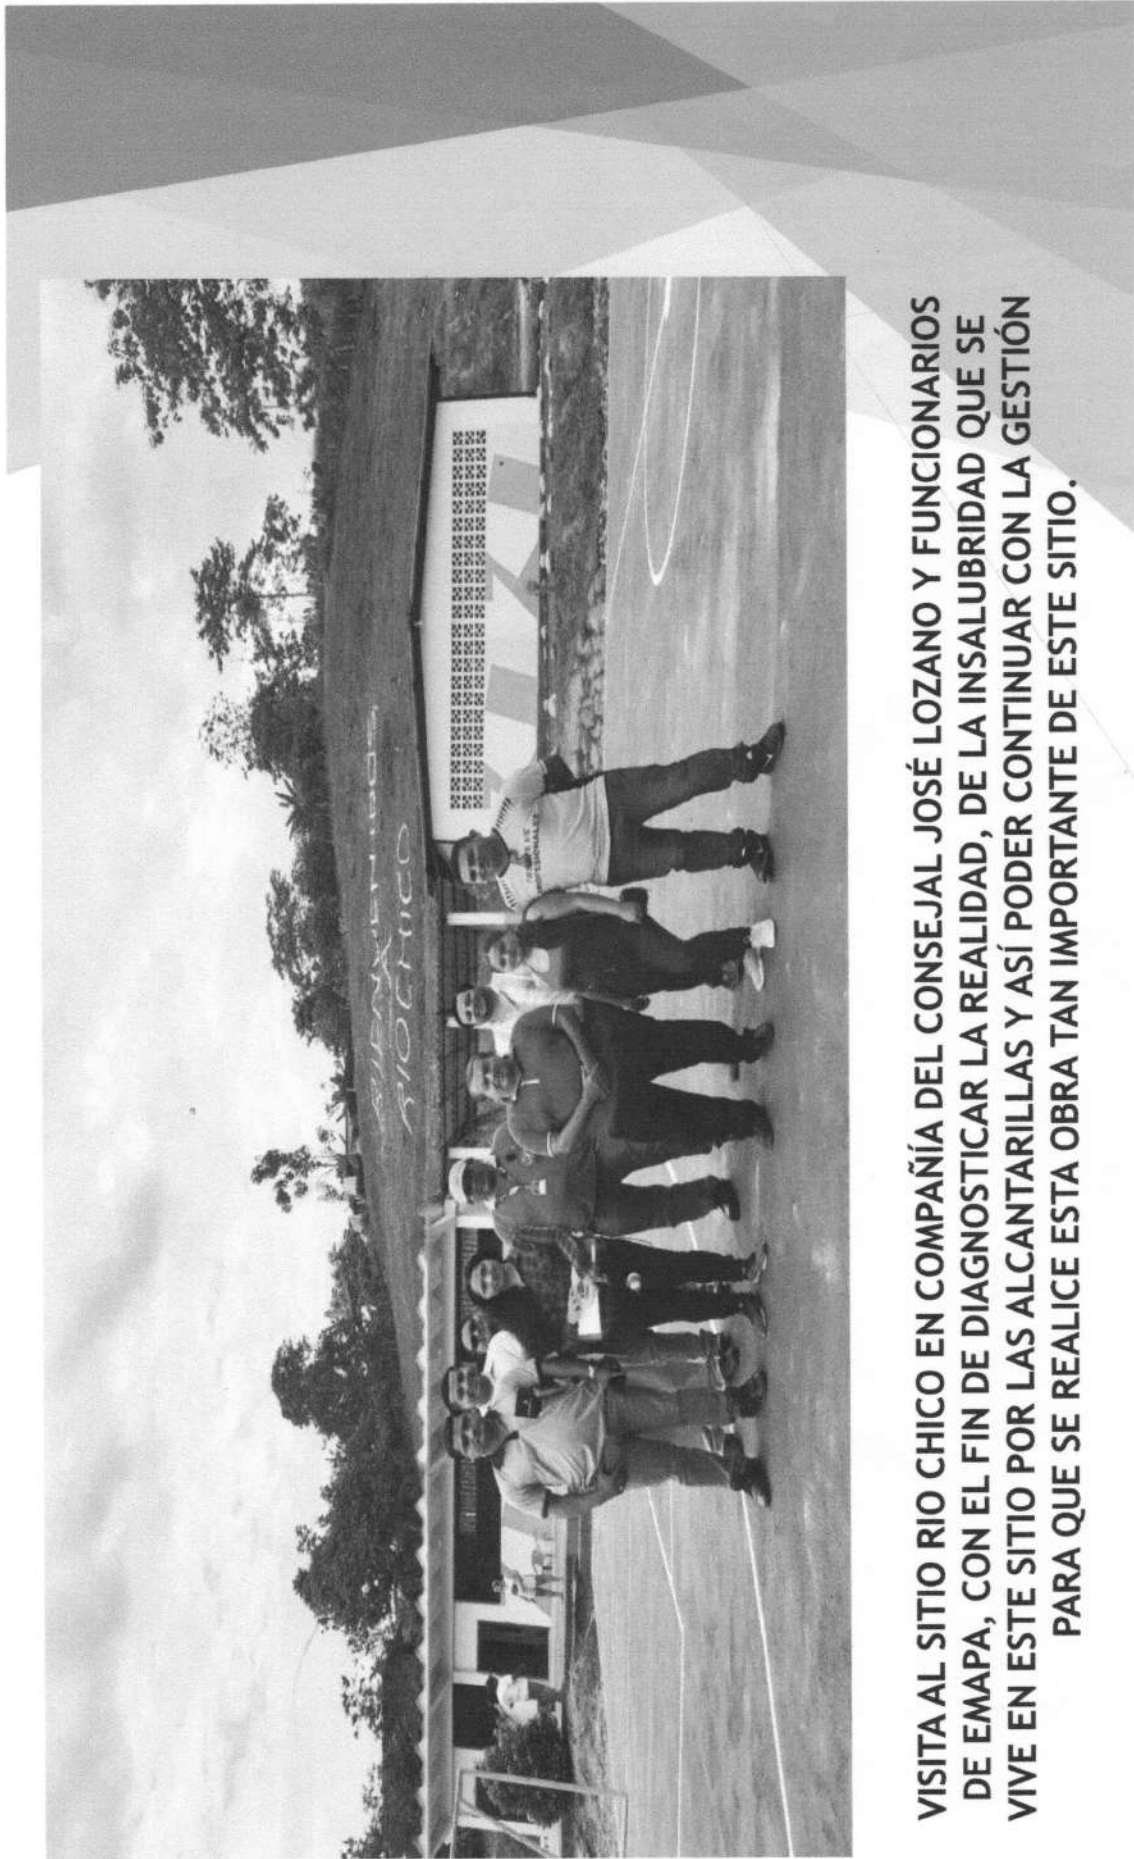

VISITA AL SITIO RIO CHICO EN COMPAÑÍA DEL CONSEJAL JOSÉ LOZANO Y FUNCIONARIOS DE EMAPA, CON EL FIN DE DIAGNOSTICAR LA REALIDAD, DE LA INSALUBRIDAD QUE SE VIVE EN ESTE SITIO POR LAS ALCANTARILLAS Y ASÍ PODER CONTINUAR CON LA GESTIÓN PARA QUE SE REALICE ESTA OBRA TAN IMPORTANTE DE ESTE SITIO.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA**

Fundada el 22 de julio de 1992 con personería jurídica por Acuerdo Ministerial No 1171 y
Publicado en el Registro Oficial No 10 del 27 de agosto de 1992
BELLAMARÍA - SANTA ROSA - EL ORO
Email: ipbellamaria@psn.ec - abg.bellamaria@outlook.com
www.bellamariasantarosajob.ec - RUC: 0760029910001
DIRECCIÓN: Luis Cardenas y Carlos León
Celular: 0969139237 - 0991171691

Oficio N° 119-GADPRB-2019
Bellamaria, martes 03 de septiembre del 2019.

Ingeniero,
Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ROSA.

Presente. -

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamaria y a la vez permitanos desearte éxito en sus funciones diarias

Quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamaria nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida se incluya dentro del presupuesto de la noble institución que usted acertadamente dirige, ya que se está elaborando en este año el POA del año 2020, como Obra Prioritaria EL ALCANTARILLADO INTEGRAL EN EL SITIO RIO CHICO DE LA PARROQUIA DE BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA EL ORO, ya que el estudio del proyecto lo tiene la empresa EMAPA - SR EP.

Esperando que la presente tenga la acogida favorable y debida aceptación nos suscribimos de usted, expresando nuestros más sinceros agradecimientos.

Nota: se anexa oficio presentado por el presidente del Sitio Rio Chico donde se pide se ayude con la gestión de dicha obra que es de carácter prioritario.

Atentamente,

Abg. Henry Guzmán Cueva
PRESIDENTE
GADPR BELLAMARÍA
cel: 096913237



Ing. Javier Reyes Asanza
SECRETARIO - TESORERO
GADPR BELLAMARÍA
cel: 0991171691

13 SEP 2019 15:76
7269

Kely



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA**

Fundada el 22 de octubre 1992 con personería jurídica por Acuerdo Municipal No 1171 y

Publicada en el Registro Oficial No 995 del 7 de agosto de 1992

BELLAMARÍA - SANTA ROSA - EL ORO

Entidad Jurídica descentralizada del Estado de Ecuador

www.gadprbellamaria.gob.ec | www.gadprbellamaria.com

Teléfono: 0769139237 - 0769139237

Celular: 0969139237 - 0991171691

Oficio N° 095-GADPRB-2019
Bellamaria, 19 de agosto del 2019

Doctor,
Jorge Cruz
SUB - CENTRO DE SALUD DE BELLAMARÍA Y VALLE HERMOSO.

Presente. -

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamaria y permitanos a la vez desearte éxito en sus funciones diarias.

Quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamaria nos dirigimos a usted para hacerle conocer que se ha venido gestionando para nuestra Parroquia por parte del GAD Parroquial ante la empresa privada ODIN MINING SA, 2 Brigadas médicas, las mismas que se llevara a cabo el día 22 de agosto del 2019 en Bellamaria y el día 13 de septiembre del 2019 en Valle Hermoso, por tal motivo le damos a conocer a usted sobre lo antes mencionado, de la misma manera queremos pedirle nos ayude ante quien corresponda con información sobre lo que se va a necesitar (lugar de atención) y las especialidades de salud en las que se va a atender a las personas tanto para Bellamaria y Valle Hermoso para de esta manera poder comunicar a los moradores de nuestra parroquia.

Esperando que la presente tenga la acogida favorable, y contando desde ya con su presencia y participación, nos suscribimos de usted expresando nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Abg. Henry Guzmán Cueva
PRESIDENTE
GADPR BELLAMARÍA
Cel: 0969139237



Ing. Javier Reyes Asanza
SECRETARIO - TESORERO
GADPR BELLAMARÍA
cel: 0991171691







**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA**

Fundada el 22 de julio de 1992, con personería jurídica por Acuerdo Ministerial nº 1171 y
Publicación en el Registro Oficial de la Provincia de El Oro el 22 de julio de 1992.
BELLAMARÍA - SANTA ROSA - EL ORO
E-mail: goad@bellamaria.gob.ec - goad@bellamaria.gob.ec - goad@bellamaria.gob.ec
www.bellamaria.gob.ec - TEL: 0774802993 (000)
DIRECCIÓN: Luis Cárdenas y Carlos León
Celular: 0969139237 - 0991171691

Oficio N° 081-GADPRB-2019
Bellamaria, 22 de julio del 2019

Señor Ingeniero
Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaria.

La presente tiene la finalidad de solicitar a usted, que se incluya en el
presupuesto de su Institución para este año 2019 como obra prioritaria la
colocación de UNA CAPA ASFALTICA DE LA VIA DESDE BELLAMARÍA
HASTA VALLE HERMOSO; porque la administración anterior de la prefectura ya
realizo los estudios correspondientes de la vía en mención y esta es la vía
principal más importante de nuestra parroquia porque brinda servicio de
transporte a las comunidades que son productivas y turísticas.

Por la gentil y positiva atención al presente, anticipamos nuestros sinceros
agradecimientos.

**NOTA: Adjuntamos copia de todas las solicitudes que se han enviado a la
prefectura desde el año 2014.**

Atentamente,


Abg. Henry Guaman Cueva
PRESIDENTE
GADPR BELLAMARÍA





Ing. Javier Reyes Asanza
SECRETARIO - TESSORERO
GADPR BELLAMARÍA


RECIBIDO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PREFECTURA DE BELLAMARÍA
FECHA: 24 JUL 2019 11:50
HORA: 11:50



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA**

Fundado el 22 de mayo de 1993 por el Decreto Ejecutivo No. 11719, para el desarrollo de las actividades económicas, culturales, recreativas, deportivas, educativas, sanitarias, sociales, ambientales y de servicios.
 BELLAMARÍA, SANTA ROSA, EL DORADO, BOLÍVAR, ECUADOR. Tel: 0991171691
 www.bellarmia.gob.ec | www.bellarmia.gadprrb.gov.ec | www.bellarmia.gadprrb.gov.ec
 E-mail: info@bellarmia.gob.ec | info@bellarmia.gadprrb.gov.ec | info@bellarmia.gadprrb.gov.ec
 Teléfono: (0991) 171691 | Fax: (0991) 171691 | Celular: 0991171691

Oficio N° 114-GADPRB-2019
Bellarmía, martes 10 de septiembre del 2019

Ingeniero,
LARRY VITE Cevallos
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN SANTA ROSA.

Presente. -

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellarmía y a la vez permitamos desearte éxito en sus funciones.

13 SEP 2019
F. J. B.
7.26.8

KAN

Quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellarmía nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida se incluya dentro del presupuesto de la noble institución que usted acertadamente dirige, ya que se está elaborando en este año el POA del año 2020, como Obra Prioritaria EL ALCANTARILLADO INTEGRAL EN EL SITIO VALLE HERMOSO DE LA PARROQUIA DE BELLAMARÍA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA EL ORO, ya que nuestro GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA tiene el estudio correspondiente para la construcción del Sitio Valle Hermoso.

Esperando que la presente tenga la acogida favorable y debida aceptación nos suscribimos de usted, expresando nuestros más sinceros agradecimientos.

Nota: se anexa oficio presentado por el presidente del Sitio Valle Hermoso donde se pide se ayude con la gestión de dicha obra que es de carácter prioritario.

Atentamente,

Abg. Henry Guandín Cuervo
PRESIDENTE
GADPR BELLAMARÍA
cel: 096913237



Ing. Javier Reyes Asanza
SECRETARIO - TESORERO
GADPR BELLAMARÍA
cel: 0991171691



GESTIÓN CON EL ALCALDE **ING. LARRY VTE** Y MORADORES DEL SITIO EL RECREO PARA CONSEGUIR ALUMBRADO DE LA CIUDADELA 30 DE OCTUBRE.



GESTIÓN ANTE LA ALCALDÍA CON EL FIN DE CONSEGUIR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA LOS SITIOS, DONDE SE CONSIGUIÓ LA PALABRA DEL SEÑOR ALCALDE EN CONSTRUIR UN PUENTE CAJON EN EL SITIO SAN CARLOS.




INAGURACIÓN DEL PARQUE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE BELLAMARIA.



PARTICIPACIÓN EN EL ACTO DE JURAMENTO DE LA BANDERA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO "NELLY AGUIRRE CARDENAS".



**PARTICIPACIÓN EVENTO DE GRADUACIÓN INICIAL EN LA ESCUELA
"ELOY ALFARO" DEL SITIO VALLE HERMOSO.**

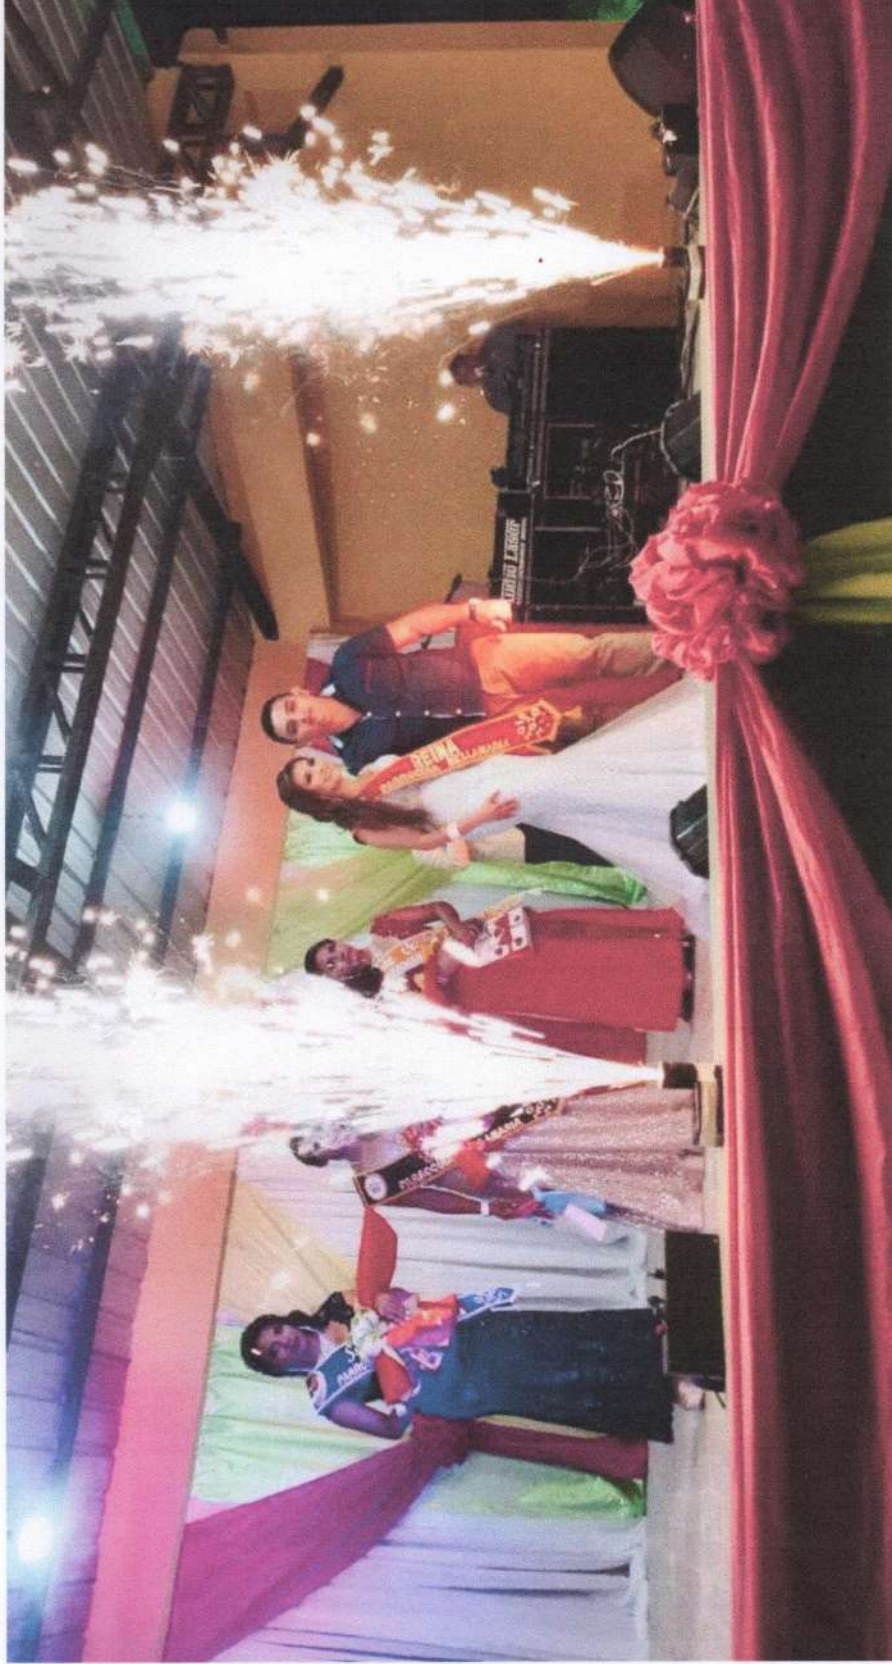

CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES POR CUMPLIR 27 AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN DE BELLAMARIA.





CELEBRACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD PARA LOS NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.
