


RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE GESTIONES REALIZADAS.


MAYO 2019 – DICIEMBRE 2019.



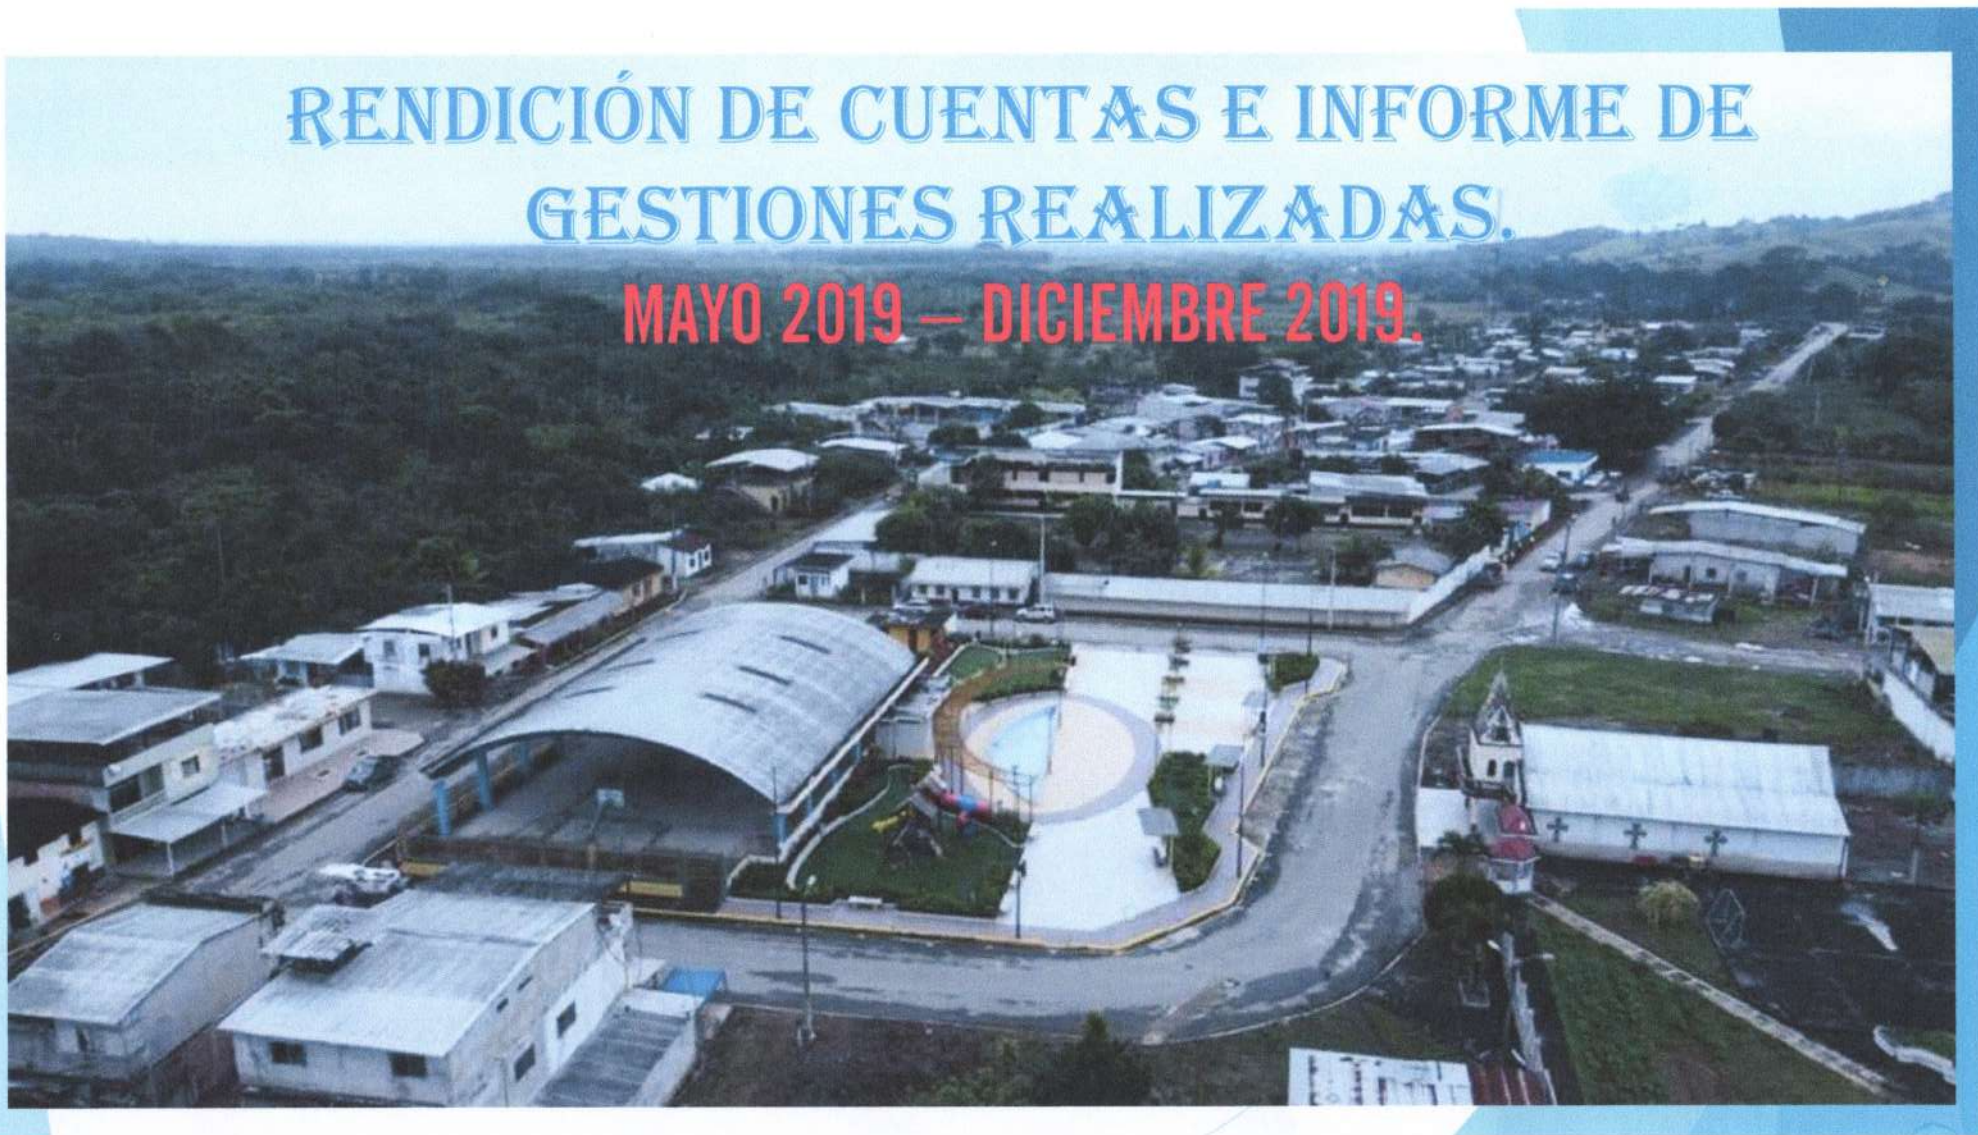

GAD PARROQUIAL RURAL DE
BELLAMARIA

HENRY
GUAMÁN
PRESIDENTE





CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL LA JUNTA PARROQUIAL

CON UN MONTO TOTAL DE \$69.202,56 INCLUIDO IVA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA

Obra: "CONSTRUCCION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL CRO, I ETAPA"

Contratante: GAD Parroquial Rural de Bellamaria
 Contratista: Construcciones Félix Cofreix Cía. Ltda.
 Fiscalizador: Ing. Edinson Cún Guzmán
 Administrador: Ing. Arturo Carrillo

Fecha de presentación: 29 de Octubre del 2019
 Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019
 Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019
 Plazo de ejecución: 90 Días

Monto del contrato: \$ 60,019.02
 Valor de anticipo: \$ 30,009.51
 Planilla por (USD): \$ 24,254.00
 Periodo de ejecución: 26 de Septiembre al 25 de Octubre del 2019

Item	Rubros	CONTRATADO			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra	
		Udidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo		Total a la fecha
1	Limpieza y desalojo de la obra	m2	97.66000	2.34935	229.43752	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2	Replanteo y nivelación para construcciones	m2	97.66000	1.51168	147.63067	0.0000	100.4500	100.4500	0.0000	151.8500	151.8500	0.25%
3	Cerramiento provisional (planchas onduladas de zinc de 8 pies)	ml	35.00000	16.45711	575.99885	0.0000	12.0000	12.0000	0.0000	197.4900	197.4900	0.13%
4	Demolición de estructuras existentes	m3	30.00000	29.96760	899.02800	0.0000	28.6990	28.6990	0.0000	859.7700	859.7700	1.43%
5	Excavación a máquina para estructuras	m3	86.85900	3.47143	301.52494	0.0000	109.7400	109.7400	0.0000	380.9500	380.9500	0.63%
6	Relleno con piedra bola	m3	8.08500	27.84745	225.14663	0.0000	5.1800	5.1800	0.0000	144.2500	144.2500	0.24%
7	Relleno compactado con material de excavación	m3	12.70500	6.96984	88.54182	0.0000	13.9400	13.9400	0.0000	97.1600	97.1600	0.16%
8	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	39.06400	17.64745	689.37999	0.0000	15.6700	15.6700	0.0000	276.5400	276.5400	0.46%
9	Desalojo de material de excavación y escombros	m3	74.15400	3.66005	256.57655	0.0000	124.4900	124.4900	0.0000	430.7400	430.7400	0.72%
10	Hormigon simple f'c=180 Kg/cm², replantíos	m3	1.74200	173.30292	301.89369	0.0000	1.5800	1.5800	0.0000	273.8200	273.8200	0.46%
11	Hormigon simple f'c=210 Kg/cm², pilotes	m3	4.35500	180.05620	784.14475	0.0000	6.7600	6.7600	0.0000	1217.1800	1217.1800	2.03%
12	Hormigon simple f'c=210 Kg/cm², muñecos	m3	0.45000	241.16325	108.52346	0.0000	0.4300	0.4300	0.0000	103.7000	103.7000	0.17%
13	Hormigon simple f'c=210 Kg/cm², riostras	m3	7.26000	201.98325	1466.39840	0.0000	8.3800	8.3800	0.0000	1692.6200	1692.6200	2.92%
14	Hormigon simple f'c=210 Kg/cm², columnas	m3	3.25500	241.16325	784.96638	0.0000	3.2500	3.2500	0.0000	783.7800	783.7800	1.31%
15	Hormigon simple f'c=210 Kg/cm², vigas	m3	5.33750	251.07207	1344.36717	0.0000	6.6300	6.6300	0.0000	1669.9100	1669.9100	2.78%
16	Losa alivianada H/Ao f'c=210 Kg/cm², e=20cm	m2	112.16660	89.18860	10003.98202	0.0000	98.5200	98.5200	0.0000	8786.8600	8786.8600	14.04%
17	Hormigon armado f'c=210 Kg/cm², contrapiso e=10cm	m2	97.66000	32.77488	3200.75478	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
18	Mesones de hormigon armado f'c=210 Kg/cm²	ml	0.90000	81.31921	73.18729	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
19	Aguero de refuerzo en barras fy=4200 Kg/cm2	Kg	2678.02236	2.43371	6517.52980	0.0000	2953.2600	2953.2600	0.0000	7187.3800	7187.3800	11.98%
20	Mampostería de bloque macizo e=7 cm	m2	177.84000	14.56813	2590.75624	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
21	Echado vertical 1.3	m2	398.49000	9.39684	3744.56777	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
22	Echado horizontal 1.3	m2	112.16660	10.23190	1147.67743	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
23	Fios	ml	250.50000	5.77285	1446.06893	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
24	Porcelanato en fachada	m2	67.50000	36.44980	2460.36150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
25	Porcelanato en piso	m2	97.66000	35.48980	3465.93387	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
26	Cerámica en paredes de baños	ml	34.56000	32.48492	1122.67884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
27	Recubrimiento de granito en mesones	ml	0.90000	138.61212	124.75091	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
28	Empaste	m2	450.58660	4.65745	2098.58456	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
29	Pintura de latex	m2	450.58660	5.65498	2548.05821	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
30	Puerta laticed	m2	21.77000	92.01460	2003.15784	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
31	Puerta de la abertila de vidrio templado 2.00x2.00m	u	1.00000	1778.30904	1778.30904	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
32	Puerta de madera (varias medidas)	u	8.00000	247.5452	1972.2616	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
33	Ventanas de aluminas y vidrio	m2	15.36000	84.13113	1291.97768	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
34	Automato eléctrica	ml	25.00000	13.48804	337.20100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
35	Caja de breakers (16 unidades)	u	1.00000	218.47704	218.47704	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA






PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA

Obra: "CONSTRUCCION DE LA RUTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL CRO, ETAPA"

Contratante: GAD Parroquial Rural de Bellamaria
 Contratista: Construcciones Femen Cofemex Cia. Ltda.
 Fiscalizador: Ing. Ederson Cui Guzman
 Administrador: Ing. Arturo Carrillo

Fecha de presentación: 29 de Octubre del 2019
 Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019
 Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019
 Plazo de ejecución: 90 Dias

Monto del contrato: 5.60.019,02
 Valor de anticipo: 5.30.000,51
 Planilla por (USD): 5.24.254,06
 Periodo de ejecución: 26 de Septiembre al 25 de Octubre del 2019

Item	Rubros	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra			
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha				
36	Tornavientos doble polarizado 110v	pto	10,00000	34.37691	343.76910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
37	Tornavientos polarizado 220v	pto	4,00000	60.70964	242.83856	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
38	Puntos de luz	pto	15,00000	34.15162	512.27430	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
39	Punto de t.	pto	4,00000	30.76282	123.05128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
40	Punto de telefonía	pto	3,00000	29.89683	89.69049	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
41	Isolación	u	4,00000	147.31239	589.24956	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
42	Levamientos	u	3,00000	109.15452	327.46356	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
43	Llave de paso cortadora Ø 12" (red white)	u	3,00000	28.08765	84.26295	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
44	Llave para levamientos	u	3,00000	35.21680	105.65040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
45	Puntos de agua potable	pto	7,00000	33.08690	231.60830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
46	Puntos de agua servidas	pto	7,00000	34.68527	242.79689	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
47	Puntos de revisión	u	3,00000	94.24152	282.72456	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
48	Proveer e instalación de tubería PVC Ø 4"	ml	20,00000	10.21490	204.29800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
49	Tanque elevado 1000 lt	u	1,00000	284.41104	284.41104	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%			
VALOR TOTAL CONTRATADO (USD)					60019,02								48,41%		
  									VALOR PLANILLADO			0,00	24254,00	24254,00	
									IVA			12,00%	0,00	2910,48	2910,48
									TOTAL SUMAN				0,00	27164,48	27164,48
									DESC. ANTICIPO			50,00%	0,00	12127,00	12127,00
									DESC. IVA			30,00%	0,00	873,14	873,14
									DESC. IMP. RENTA			1,00%	0,00	242,54	242,54
									RETRASO			1,00%	0,00	0,00	0,00
									SALDO LIQUIDO A PAGARSE:				0,00	13921,80	13921,80



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



PLANILLA No. 2 DE AVANCE DE OBRA

Obra: "CONSTRUCCION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, IETAPA"

Contratante: GAD Parroquial Rural de Bellamaria
 Contratista: Construcciones Fénix Cofenix Cia. Ltda.
 Fiscalizador: Ing. Edinson Cón Guzmán
 Administrador: Ing. Arturo Carrillo

Fecha de presentación: 26 de Noviembre del 2019
 Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019
 Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019
 Plazo de ejecución: 90 Días

Monto del contrato: \$ 60,019.02
 Valor de anticipo 1: \$ 30,009.51
 Planilla por (USD): \$ 9,276.40
 Periodo de ejecución: 26 de Octubre al 24 de Noviembre del 2019

Item	Rubros	CONTRATADO			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra	
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo		Total a la fecha
1	Limpieza y desalojo de la obra	m2	97.6600	2.3494	229.4375	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2	Replanteo y nivelación para construcciones	m2	97.6600	1.5117	147.6307	100.4500	0.0000	100.4500	151.8500	0.0000	151.8500	0.25%
3	Cerramiento provisional (planchas onduladas de zinc de 8 pies)	ml	35.0000	16.4571	575.9289	12.0000	0.0000	12.0000	197.4900	0.0000	197.4900	0.33%
4	Demolicion de estructuras existentes	m3	30.0000	29.9676	899.0280	28.6900	0.0000	28.6900	859.7700	0.0000	859.7700	1.43%
5	Excavacion a maquina para estructuras	m3	86.8590	3.4714	301.5249	109.7400	0.0000	109.7400	380.9500	0.0000	380.9500	0.63%
6	Relleno con piedra bola	m3	8.0850	27.8475	225.1466	5.1800	0.0000	5.1800	144.2500	0.0000	144.2500	0.24%
7	Relleno compactado con material de excavacion	m3	12.7050	6.9698	88.5518	13.9400	0.0000	13.9400	97.1600	0.0000	97.1600	0.16%
8	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	39.0640	17.6475	689.3800	15.6700	0.0000	15.6700	276.5400	0.0000	276.5400	0.46%
9	Desalojo de material de excavacion y escombros	m3	74.1540	3.4601	256.5766	124.4900	0.0000	124.4900	430.7400	0.0000	430.7400	0.72%
10	Hormigon simple Fc= 180 Kg/cm², replantillos	m3	1.7420	174.3029	301.8947	1.5800	0.0000	1.5800	273.8200	0.0000	273.8200	0.46%
11	Hormigon simple Fc= 210 Kg/cm², plantos	m3	4.3550	180.0562	784.1448	6.7600	0.0000	6.7600	1217.1800	0.0000	1217.1800	2.03%
12	Hormigon simple Fc= 210 Kg/cm², muezcos	m3	0.4500	241.1633	108.5235	0.4300	0.0000	0.4300	103.7000	0.0000	103.7000	0.17%
13	Hormigon simple Fc= 210 Kg/cm², riostras	m3	7.2600	201.9833	1466.9884	8.3800	0.0000	8.3800	1692.6200	0.0000	1692.6200	2.82%
14	Hormigon simple Fc= 210 Kg/cm², columnas	m3	3.2550	241.1633	784.9864	3.2500	0.3600	3.6100	783.7800	86.8200	870.6000	1.45%
15	Hormigon simple Fc= 210 Kg/cm², vigas	m3	5.3375	251.8721	1344.3672	6.6300	0.1900	6.8200	1669.9100	47.8600	1717.7700	2.86%
16	Losa alivianada Ho Ao Fc= 210 kg/cm², e= 20cm	m2	112.1666	89.1886	10003.9820	98.5200	0.0000	98.5200	8786.8600	0.0000	8786.8600	14.64%
17	Hormigon armado Fc= 210 Kg/cm², contrapiso e= 10cm	m2	97.6600	32.7749	3200.7948	0.0000	85.4400	85.4400	0.0000	2800.2900	2800.2900	4.67%
18	Mesones de hormigon armado Fc= 210 Kg/cm²	ml	0.9000	81.3192	73.1873	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
19	Acero de refuerzo en barras fy= 4200 Kg/cm²	Kg	2678.0224	2.4337	6517.5298	2953.2600	0.0000	2953.2600	7187.3800	0.0000	7187.3800	11.98%
20	Mamposteria de bloque trazo e= 7 cm	m2	177.8400	14.5681	2590.7962	0.0000	177.4700	177.4700	0.0000	2585.4100	2585.4100	4.31%
21	Enlucido vertical 1:3	m2	398.4900	9.3968	3744.5468	0.0000	301.7900	301.7900	0.0000	2815.8700	2815.8700	4.72%
22	Enlucido horizontal 1:3	m2	112.1666	10.2319	1147.6774	0.0000	89.9300	89.9300	0.0000	920.1500	920.1500	1.53%
23	Filos	ml	250.5000	5.7729	1446.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
24	Porcelanato en fachada	m2	67.5000	36.4498	2460.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
25	Porcelanato en pisos	m2	97.6600	35.4898	3465.9339	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
26	Cerámica en paredes de baños	ml	34.5600	32.4849	1122.6788	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
27	Recubrimiento de granito en mesones	ml	0.9000	138.6121	124.7509	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
28	Empaste	m2	450.5866	4.6575	2098.5846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
29	Pintura de latex	m2	450.5866	5.6550	2548.0582	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
30	Puerta lanford	m2	21.7700	92.0146	2003.1578	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
31	Puerta doble abatible de vidrio templado 2.00x2.00m	u	1.0000	1778.3090	1778.3090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
32	Puerta de madera (varias medidas)	u	8.0000	247.1545	1977.2362	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
33	Ventanas de aluminio y vidrio	m2	15.3600	84.1131	1291.9777	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
34	Acornetida electrica	ml	25.0000	13.4880	337.2010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
35	Caja de breakers (16 unidades)	u	1.0000	218.4770	218.4770	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
36	Tomasocorrientes doble polarizado 110v	pto	10.0000	34.3769	343.7691	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
37	Tomasocorrientes polarizado 220v	pto	4.0000	60.7096	242.8386	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
38	Puntos de luz	pto	15.0000	34.1516	512.2743	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
39	Punto de tv	pto	4.0000	30.7628	123.0513	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
40	Punto de telefono	pto	3.0000	29.8968	89.6905	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
41	Inodoro	u	4.0000	147.3124	589.2496	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE BELLAMARIA**






PLANILLA No. 2 DE AVANCE DE OBRA

Obra: "CONSTRUCCION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, 1 ETAPA"

Contratante: GAD Parroquial Rural de Bellamaria
 Contratista: Construcciones Faux Cofenis Cia. Ltda.
 Fiscalizador: Ing. Edinson Cua Guzmán
 Administrador: Ing. Arturo Carrillo

Fecha de presentación: 26 de Noviembre del 2019
 Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019
 Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019
 Plazo de ejecución: 90 Días

Monto del contrato: \$ 60.019.02
 Valor de anticipo 1: \$ 30.009.51
 Planilla por (USD): \$ 9.276.40
 Periodo de ejecución: 26 de Octubre al 24 de Noviembre del 2019

Item	Rubros	CONTRATADO			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra	
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo		Total a la fecha
42	Lavamanos	u	3.0000	109.1545	327.4636	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
43	Llave de paso cortadora Ø 1.2" (red white)	u	3.0000	28.0872	84.2630	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
44	Llave para lavamanos	u	3.0000	35.2168	105.6504	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
45	Puntos de agua potable	pto	7.0000	33.0869	231.6083	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
46	Puntos de agua servidas	pto	7.0000	34.6853	242.7969	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
47	Puntos de revision	u	3.0000	94.2415	282.7246	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
48	Provision e instalacion de tuberia PVC Ø 4"	ml	20.0000	10.2149	204.2980	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
49	Tanque elevado 1000 l	u	1.0000	284.4110	284.4110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
VALOR TOTAL CONTRATADO (USD):					60019.02							55.97%
 COFENIS CIA. LTDA CONTRATISTA		 ING. EDINSON CUA GUZMAN FISCALIZADOR		 ING. ARTURO CARRILLO ADMINISTRADOR		VALOR PLANILLADO			24254.00	9276.40	33530.40	
						IVA	12.00%	2910.48	1113.17	4023.65		
TOTAL SUMAN						27164.48	10389.57	37554.05				
DESC. ANTICIPO						50.00%	12127.00	4638.20	16765.20			
DESC. IVA						30.00%	875.14	333.95	1207.09			
DESC. IMP. RENTA						1.00%	242.54	92.76	335.30			
RETRASO						1.00%	0.00	0.00	0.00			
SALDO LIQUIDO A PAGARSE:							13921.80	5324.66	19246.46			

SON: CINCO MIL TRECENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



PLANILLA No. 3 DE LIQUIDACION DE OBRA

Obra: "CONSTRUCCION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, IETAPA"

Contratante: GAD Parroquial Rural de Bellamaria
 Contratista: Construcciones Félix Cofre S.A. Ltda.
 Fiscalizador: Ing. Edinson Cua Guzmán
 Administrador: Ing. Arturo Carrillo

Fecha de presentación: 26 de Noviembre del 2019
 Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019
 Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019
 Plazo de ejecución: 90 Días

Monto del contrato: \$ 60,019.02
 Valor de anticipo: \$ 30,009.51
 Planilla por (USD): \$ 28,257.69
 Período de ejecución: 25 de Noviembre al 24 de Diciembre del 2019

Item	Rubros	CONTRATADO			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra	
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo		Total a la fecha
1	Limpieza y desalojo de la obra	m2	97.6600	2.3494	229.4375	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2	Replanteo y nivelación para construcciones	m2	97.6600	1.3117	147.6307	100.4500	0.0000	100.4500	151.8500	0.0000	151.8500	0.25%
3	Cerramiento provisional (planchas onduladas de zinc de 8 pies)	m2	35.0000	16.4571	575.9989	12.0000	0.0000	12.0000	197.4900	0.0000	197.4900	0.33%
4	Demolicion de estructuras existentes	m3	30.0000	29.9676	899.0280	28.6900	0.0000	28.6900	859.7700	0.0000	859.7700	1.43%
5	Excavacion a maquinaria para estructuras	m3	86.8390	3.4714	301.5249	109.7400	0.0000	109.7400	380.9500	0.0000	380.9500	0.63%
6	Relleno con piedra bola	m3	8.0850	27.8475	225.1466	5.1800	0.0000	5.1800	144.2500	0.0000	144.2500	0.24%
7	Relleno compactado con material de excavacion	m3	12.7050	6.9698	88.5518	13.9400	0.0000	13.9400	97.1600	0.0000	97.1600	0.16%
8	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	39.0640	17.6475	689.3800	15.6700	0.0000	15.6700	276.3400	0.0000	276.3400	0.46%
9	Desalojo de material de excavacion y escombros	m3	74.1540	3.4601	256.5766	124.4900	0.0000	124.4900	430.7400	0.0000	430.7400	0.72%
10	Hormigon simple f'c=210 kg/cm², replantillos	m3	1.7420	173.3029	301.8937	1.5800	0.0000	1.5800	273.8200	0.0000	273.8200	0.46%
11	Hormigon simple f'c=210 kg/cm², pilotes	m3	4.3550	180.0562	784.1448	6.7600	0.0000	6.7600	1217.1800	0.0000	1217.1800	2.03%
12	Hormigon simple f'c=210 kg/cm², muretes	m3	0.4500	241.1633	108.5235	0.4300	0.0000	0.4300	103.7000	0.0000	103.7000	0.17%
13	Hormigon simple f'c=210 kg/cm², muretes	m3	7.2600	201.9833	1466.3984	8.3800	0.0000	8.3800	1692.6200	0.0000	1692.6200	2.82%
14	Hormigon simple f'c=210 kg/cm², columnas	m3	3.2550	241.1633	784.9864	3.6100	0.0000	3.6100	870.6000	0.0000	870.6000	1.45%
15	Hormigon simple f'c=210 kg/cm², vigas	m3	5.3375	251.8721	1344.3672	6.8200	0.0000	6.8200	1717.7700	0.0000	1717.7700	2.86%
16	Losa alivianada Ho. A= f'c= 210 kg/cm², e=20cm.	m2	112.1666	89.1886	10003.9820	98.5200	0.0000	98.5200	8786.8600	0.0000	8786.8600	14.64%
17	Hormigon armado f'c=210 kg/cm², contrapiso e=10cm	m2	97.6600	32.7749	3200.7948	85.4400	85.2900	170.7300	2800.2900	2791.3700	5495.6600	9.32%
18	Masas de hormigon armado f'c=210 kg/cm²	m2	0.9000	81.3192	73.1873	0.0000	0.9000	0.9000	73.1900	0.0000	73.1900	0.12%
19	Masas de hormigon armado f'c=210 kg/cm²	m2	2678.0224	2.4337	6517.5298	2953.2600	0.0000	2953.2600	7187.3800	0.0000	7187.3800	11.98%
20	Aceros de refuerzo en barras Ho= 4200 kg/cm²	Kg	177.8400	14.5681	2590.7962	177.4700	0.0000	177.4700	2585.4100	0.0000	2585.4100	4.31%
21	Mamposteria de bloques macizo e= 7 cm	m2	398.4900	9.3968	3744.5468	301.7900	0.0000	301.7900	2835.8700	0.0000	2835.8700	4.72%
22	Ezulado vertical 1:3	m2	112.1666	10.2319	1147.6774	89.9300	0.0000	89.9300	920.1500	0.0000	920.1500	1.53%
23	Ezulado horizontal 1:3	m2	250.5000	5.7729	1446.0989	0.0000	315.4400	315.4400	0.0000	1820.9900	1820.9900	3.03%
24	Filas	m2	67.5000	36.4498	2460.3615	0.0000	45.3600	45.3600	0.0000	1633.3600	1633.3600	2.75%
25	Porcelanato en fachada	m2	97.6600	35.4898	3465.9339	0.0000	170.7900	170.7900	0.0000	6061.3000	6061.3000	10.10%
26	Porcelanato en pisos	m2	34.5600	32.4849	1122.6788	0.0000	46.6000	46.6000	0.0000	1513.8000	1513.8000	2.52%
27	Ceramica en paredes de baños	m2	0.9000	138.6121	124.7509	0.0000	0.9000	0.9000	0.0000	124.7500	124.7500	0.21%
28	Recubrimiento de granito en mamparas	m2	450.5866	4.6575	2098.5846	0.0000	295.3300	295.3300	0.0000	1375.4800	1375.4800	2.29%
29	Lapaste	m2	450.5866	5.6550	2548.0582	0.0000	322.5300	322.5300	0.0000	1823.9000	1823.9000	3.04%
30	Pintura de latex	m2	21.7700	92.0146	2003.1578	0.0000	10.8500	10.8500	0.0000	998.3600	998.3600	1.66%
31	Puerta lardford	u	1.0000	1778.3090	1778.3090	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1778.3100	1778.3100	2.96%
32	Puerta doble abatible de vidrio templado 2.00x2.00m	u	8.0000	247.1545	1977.2362	0.0000	8.0000	8.0000	0.0000	1977.2400	1977.2400	3.29%
33	Puerta de madera (varias medidas)	u	15.3600	84.1131	1291.9777	0.0000	15.3600	15.3600	0.0000	1291.9800	1291.9800	2.15%
34	Ventanas de aluminio y vidrio	m2	25.0000	13.4880	337.2010	0.0000	20.0000	20.0000	0.0000	269.7600	269.7600	0.45%
35	Acometida electrica	m	1.0000	218.4770	218.4770	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	218.4800	218.4800	0.36%
36	Caja de transform (16 unidades)	u	10.0000	343.7691	3437.6910	0.0000	10.0000	10.0000	0.0000	343.7700	343.7700	0.57%
37	Tomacorrientes doble polarizado 110v	pzo	4.0000	60.7096	242.8386	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	242.8400	242.8400	0.40%
38	Tomacorrientes polarizado 220v	pzo	15.0000	34.1516	512.2743	0.0000	15.0000	15.0000	0.0000	512.2700	512.2700	0.85%
39	Punto de luz	pzo	4.0000	30.7628	123.0513	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
40	Punto de tv	pzo	3.0000	29.8968	89.6903	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
41	Telefono	u	4.0000	147.3124	589.2496	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	589.2500	589.2500	0.98%



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



PLANILLA No. 3 DE LIQUIDACION DE OBRA

Obra: "CONSTRUCCION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, I ETAPA"

Contratante: GAD Parroquial Rural de Bellamaria
 Contratista: Construcciones Fénix Cofenix Cia. Ltda.
 Fiscalizador: Ing. Edison Cua Guzmán
 Administrador: Ing. Arturo Carrillo

Fecha de presentación: 26 de Noviembre del 2019
 Fecha de contrato: 13 de Septiembre del 2019
 Fecha de inicio de obra: 26 de Septiembre del 2019
 Plazo de ejecución: 90 Días

Monto del contrato: \$ 60,019.02
 Valor de anticipo: \$ 35,000.51
 Planilla por (USD): \$ 28,257.60
 Periodo de ejecución: 25 de Noviembre al 24 de Diciembre del 2019

Item	Rubros	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	
42	Lavamanos	u	3.0000	109.1545	327.4636	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	327.4600	327.4600	0.55%
43	Llave de paso cortadora Ø 1 2" (red white)	u	3.0000	28.0877	84.2630	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	28.0900	28.0900	0.05%
44	Llave para lavamanos	u	3.0000	35.2168	105.6504	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	105.6500	105.6500	0.18%
45	Puntos de agua potable	pto	7.0000	33.0869	231.6083	0.0000	7.0000	7.0000	0.0000	231.6100	231.6100	0.39%
46	Puntos de agua servidas	pto	7.0000	34.6853	242.7969	0.0000	7.0000	7.0000	0.0000	242.8000	242.8000	0.40%
47	Pozos de revision	u	3.0000	94.2415	282.7246	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	188.4800	188.4800	0.31%
48	Provision e instalacion de tuberia PVC Ø 4"	ml	20.0000	10.2149	204.2980	0.0000	24.1000	24.1000	0.0000	246.1800	246.1800	0.41%
49	Tanque elevado 1000 lt	u	1.0000	284.4110	284.4110	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	284.4100	284.4100	0.47%
VALOR TOTAL CONTRATADO (USD)					60019.0177							
RUBRO NUEVO (COSTO MAS PORCENTAJE)												
50	Rejas metalicas	m2	11.5200	98.8300	1138.5216	0.0000	11.5200	11.5200	0.0000	1138.5200	1138.5200	1.90%
VALOR PLANILLADO									33530.40	28257.60	61788.00	
IVA 12.00%									4023.65	3390.91	7414.56	
TOTAL SUMAN									37554.05	31648.51	69202.56	
DESC. ANTICIPO 50.00%									16765.20	13244.31	30009.51	
DESC. IVA 30.00%									1207.09	1017.27	2224.36	
DESC. IMP. RENTA 1.00%									335.30	282.58	617.88	
RETRASO 1.00%									0.00	0.00	0.00	
SALDO LIQUIDO A PAGARSE:									19246.46	17104.35	36350.81	

COFENIX CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

ING. EDISON CUA GUZMAN
 FISCALIZADOR

ING. ARTURO CARRILLO
 ADMINISTRADOR

SON: DIECISIETE MIL CIENTO CUATRO CON 35/100 DOLARES AMERICANOS



PROYECTO ADULTO MAYOR

CON UN GASTO TOTAL DE \$13.771,97 INCLUIDO IVA Y 50 BENEFICIADOS.





COMPARTIENDO EN EL DÍA DE ADULTO MAYOR



PROYECTO DISCAPACIDAD

GASTOS EN CONVENIO: GAD.P.R DE BELLAMARIA \$4.95,51 - MIES \$11.648,03
TOTAL: \$16.602,54 INCLUIDO IVA - 30 BENEFICIARIOS



**COMPARTIENDO CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON CAPACIDADES ESPECIALES**



PROYECTO INOCENTRO

GASTO TOTAL GAD.P.R DE BELLAMARIA \$49,76 INCLUIDO IVA



ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSO REALIZADO EN EL INFOCENTRO DE BELLAMARIA.



PROYECTO MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES

GASTO TOTAL GAD DE BELLAMARIA \$ 6.460,72 INCLUIDO IVA



FIRMA DE CONVENIO CON ALCALDÍA Y PREFECTURA PARA EL ASFALTO DE ALREDEDOR DE LAS CALLES DEL PARQUE DEL SITIO VALLE HERMOSO.



GESTIÓN ANTE LA ALCALDIA PARA CONSEGUIR MATERIAL PETREO, CEMENTO Y CONCRETERA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO VADEN CON AYUDA DE LOS MORADORES DEL SITIO PIRIGUIÑA QUIENES TRABAJARON EN MINGAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO.





GESTIÓN DE MATERIAL PETREO Y MAQUINARIA PARA EL LASTRADO DE LA VÍA PIEDRA REDONDA.

Bellamaría

Parroquia próspera.

EL GAD Parroquial de Bellamaría hace una cordial invitación a todas las personas colaboradoras de nuestra Parroquia a ser partícipes de una gran minga para realizar el pintado de bordillos de la cabecera Parroquial.



Abg. HENRRY
GUAMÁN
PRESIDENTE

FECHA Y
HORA

Miércoles 17 de julio a las 15 horas (3:00 pm)
Concentración en las afueras del GAD.

MINGA DE MORADORES PARA PINTADOS DE BORDILLOS DE LA CABECERA PARROQUIAL.





ADECENTAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONABAN LA CASA PARROQUIAL TANTO COMO EL POLI DEPORTIVO, OBRA REALIZADA MEDIANTE GESTIÓN ANTE LA EMPRESA PRIVADA Y MORADORES DEL SITIO QUIENES COLABORARON EN MINGAS.



**GESTIÓN EN EL BDE PARA LA ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO NO REEMBOLSABLE QUE NO SE A
PODIDO CONSEGUIR EN LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.**



BANCO DE DESARROLLO DEL
ECUADOR B.P.



DECISIÓN No. 2019-GSZL- 255

Que, la evaluación de la presente asignación fue realizada en la parte técnica por la Coordinación de Evaluación de la Sucursal Zonal Litoral del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; y, en la parte legal, por la Coordinación Jurídica de la Sucursal Zonal Litoral;

VISTO: El Informe de Asignación No. BDE-I-CER2G-2019-0307-M, de 16 de octubre de 2019, que cuenta con el pronunciamiento favorable de las Coordinaciones de Evaluación y Jurídica; y,

En ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias y las establecidas en la Resolución No. 2014-DIR-009, de 31 de enero de 2014.

DECIDE:

Art. 1.- Conceder una asignación, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaria, hasta por USD. 55.083,22 (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES CON 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a financiar el proyecto: "Construcción de la Junta Parroquial de la parroquia Bellamaria, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro".

Art.2.- La operación se concede bajo el siguiente perfil financiero:

OPERADOR DE LA ASIGNACIÓN:	Sucursal Zonal Litoral;
ASIGNATARIO/ BENEFICIARIO:	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaria;
PROVINCIA:	El Oro;
CANTON:	Santa Rosa;
OBJETO:	Financiar la construcción de la Junta Parroquial de la parroquia Bellamaria, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro";
SECTOR:	Desarrollo humano;
PROYECTO:	"Construcción de la Junta Parroquial de la parroquia Bellamaria, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro";
PROGRAMA:	Producto BDE-GAD Parroquiales Rurales/BDE - GADPR;
FONDO:	PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - ASIG NR. MF;
VALOR DE LA DE ASIGNACIÓN:	USD. 56.788,19 Asignación con MET (sin deducir el 2% de comisión del BDE);
CUPO DE ENDEUDAMIENTO:	No registro en el sistema cupo de endeudamiento;



GESTIÓN ANTE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CANTONAL PARA QUE SE REALICEN ELECCIONES Y CONFORMACIÓN DE COMITE BARRIAL DEL SITIO BIRON.



GESTIÓN ANTE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CANTONAL PARA QUE SE REALICEN ELECCIONES Y CONFORMACIÓN DE COMITE BARRIAL DEL SITIO SAN CARLOS.



**PRESIDENTE DE LAS JUNTAS PARROQUIALES DEL CANTÓN SANTA ROSA
MIEMBRO DEL COMITE DE PLANIFICACIÓN DEL GAD CANTONAL.**



VISITA AL SITIO RIO CHICO EN COMPAÑÍA DEL CONSEJAL JOSÉ LOZANO Y FUNCIONARIOS DE EMAPA, CON EL FIN DE DIAGNOSTICAR LA REALIDAD, DE LA INSALUBRIDAD QUE SE VIVE EN ESTE SITIO POR LAS ALCANTARILLAS Y ASÍ PODER CONTINUAR CON LA GESTIÓN PARA QUE SE REALICE ESTA OBRA TAN IMPORTANTE DE ESTE SITIO.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA**

Fundada el 22 de julio de 1992 con personería jurídica por Acuerdo Ministerial N° 1171 y

Publicado en el Registro Oficial N° 995 del 7 de agosto de 1992

BELLAMARÍA - SANTA ROSA - EL ORO

Email: jpsbellamaria@gmail.com - abg.henryptamanc@outlook.com

www.bellamarialasantarosa.gob.ec - RUC: 0760029910001

DIRECCIÓN: Luis Cárdenas y Carlos León

Celular: 0969139237 - 0991171691



Oficio N° 119-GADPRB-2019
Bellamaría, martes 03 de septiembre del 2019.

13 SEP 2019 15:26
7269
kelly

Ingeniero,
Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ROSA.

Presente. -

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamaría y a la vez permitanos desearte éxito en sus funciones diarias

Quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamaría nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida se incluya dentro del presupuesto de la noble institución que usted acertadamente dirige, ya que se está elaborando en este año el POA del año 2020, como Obra Prioritaria EL ALCANTARILLADO INTEGRAL EN EL SITIO RIO CHICO DE LA PARROQUIA DE BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA EL ORO, ya que el estudio del proyecto lo tiene la empresa EMAPA - SR EP.

Esperando que la presente tenga la acogida favorable y debida aceptación nos suscribimos de usted, expresando nuestros más sinceros agradecimientos.

Nota: se anexa oficio presentado por el presidente del Sitio Rio Chico donde se pide se ayude con la gestión de dicha obra que es de carácter prioritario.

Atentamente,


Abg. Henry Guashán Cueva
PRESIDENTE
GADPR BELLAMARÍA
cel: 096913237




Ing. Javier Reyes Asanza
SECRETARIO - TESORERO
GADPR BELLAMARÍA
cel: 0991171691



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA**



Fundada el 22 de julio de 1992 con personería jurídica por Acuerdo Ministerial N° 1171 y
Publicado en el Registro Oficial N° 995 del 2 de agosto de 1992

BELLAMARÍA - SANTA ROSA - LLOMO

Email: gadsbellamaria@guatemala.com - gadsbellamaria@guatemala.com
www.bellamaria-santa-rosa.gov.gt - Tlf: 0760029910001

DIRECCIÓN: Luis Cárdenas y Carlos León
Celular: 0969139237 - 0991171691

Oficio N° 095-GADPRB-2019
Bellamaria, 19 de agosto del 2019

Doctor,
Jorge Cruz,
SUB - CENTRO DE SALUD DE BELLAMARIA Y VALLE HERMOSO.

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamaria y permitanos a la vez deseársle éxito en sus funciones diarias.


Quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamaria nos dirigimos a usted para hacerle conocer que se ha venido gestionando para nuestra Parroquia por parte del GAD Parroquial ante la empresa privada ODIN MINING SA, 2 Brigadas médicas, las mismas que se llevara a cabo el día 22 de agosto del 2019 en Bellamaria y el día 13 de septiembre del 2019 en Valle Hermoso, por tal motivo le damos a conocer a usted sobre lo antes mencionado, de la misma manera queremos pedirle nos ayude ante quien corresponda con información sobre lo que se va a necesitar (lugar de atención) y las especialidades de salud en las que se va a atender a las personas tanto para Bellamaria y Valle Hermoso para de esta manera poder comunicar a los moradores de nuestra parroquia.

Esperando que la presente tenga la acogida favorable, y contando desde ya con su presencia y participación, nos suscribimos de usted expresando nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente,


Abg. Henry Guamán Cueva
PRESIDENTE
GADPR BELLAMARÍA
Cel: 0969139237




Ing. Javier Reyes Asanza
SECRETARIO - TESORERO
GADPR BELLAMARÍA
cel: 0991171691



M. C. J. B.
MEDICO GENERAL
C.I. C. 135741





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA**



Fundada el 22 de julio de 1992 con personería jurídica por Acuerdo Ministerial N° 1171 y
Publicado en el Registro Oficial N° 995 del 7 de agosto de 1992
BELLAMARÍA - SANTA ROSA - EL ORO
Email: gobbellamaria@guanoil.com - abg.henry.guamanecueva@outlook.com
www.bellamariaesantatarosa.gob.ec - TEL: 0760029910001
DIRECCIÓN: Luis Cárdenas y Carlos León
Celular: 0969139237 - 0991171691

Oficio N° 081-GADPRB-2019
Bellamaría, 22 de julio del 2019

Señor Ingeniero
Clemente Bravo Riofrio
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaría.

La presente tiene la finalidad de solicitar a usted, que se incluya en el
presupuesto de su Institución para este año 2019 como obra prioritaria la
colocación de UNA CAPA ASFALTICA DE LA VIA DESDE BELLAMARÍA
HASTA VALLE HERMOSO; porque la administración anterior de la prefectura ya
realizo los estudios correspondientes de la vía en mención y esta es la vía
principal más importante de nuestra parroquia porque brinda servicio de
transporte a las comunidades que son productivas y turísticas.

Por la gentil y positiva atención al presente, anticipamos nuestros sinceros
agradecimientos.

**NOTA: Adjuntamos copia de todas las solicitudes que se han enviado a la
prefectura desde el año 2014.**

Atentamente,


Abg. Henry Guamán Cueva
PRESIDENTE
GADPR BELLAMARÍA




Ing. Javier Reyes Asanza
SECRETARIO - TESORERO
GADPR BELLAMARÍA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE EL ORO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 24 JUL 2019 11:50
HORA
RECIBIDO CONFORME



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA**



Fundado el 22 de Julio de 1992 por el Decreto Provincial por Asamblea Provincial Nº 1171 y
Publicado en el Registro Oficial Nº 551 del 7 de agosto de 1992
BELLAMARÍA - SANTA ROSA - EL ORO
Email: gpbellamarca@gmail.com - gpbellamarca@bellamarca.gob.ec
www.bellamarca.gob.ec - TEL: 0740527910001
DIRECCIÓN: Luis Córdova y Carlos León
Celular: 096913237 - 0991171691

Oficio N° 114-GADPRB-2019
Bellamarca, martes 10 de septiembre del 2019

Ingeniero.,
Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTON SANTA ROSA.

Presente. -

De nuestras consideraciones:

13 SEP 2019
F26
7268
Kily

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamarca y a la vez permítanos desearle éxito en sus funciones.

Quienes conformamos el GAD Parroquial Rural de Bellamarca nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida se incluya dentro del presupuesto de la noble institución que usted acertadamente dirige, ya que se está elaborando en este año el POA del año 2020, como Obra Prioritaria EL ALCANTARILLADO INTEGRAL EN EL SITIO VALLE HERMOSO DE LA PARROQUIA DE BELLAMARÍA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA EL ORO, ya que nuestro GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA tiene el estudio correspondiente para la construcción del Sitio Valle Hermoso.

Esperando que la presente tenga la acogida favorable y debida aceptación nos suscribimos de usted, expresando nuestros más sinceros agradecimientos.

Note: se anexa oficio presentado por el presidente del Sitio Valle Hermoso donde se pide se ayude con la gestión de dicha obra que es de carácter prioritario.

Atentamente,


Abg. Henry Guzmán Cuervo
PRESIDENTE
GADPR BELLAMARÍA
cel: 096913237




Ing. Javier Reyes Asanza
SECRETARIO - TESORERO
GADPR BELLAMARÍA
cel: 0991171691



GESTIÓN CON EL ALCALDE **ING.LARRY VTE** Y MORADORES DEL SITIO EL RECREO PARA CONSEGUIR ALUMBRADO DE LA CIUDADELA 30 DE OCTUBRE.



GESTIÓN ANTE LA ALCALDÍA CON EL FIN DE CONSEGUIR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA LOS SITIOS, DONDE SE CONSIGUIÓ LA PALABRA DEL SEÑOR ALCALDE EN CONSTRUIR UN PUENTE CAJON EN EL SITIO SAN CARLOS.



INAGURACIÓN DEL PARQUE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE BELLAMARIA.



PARTICIPACIÓN EN EL ACTO DE JURAMENTO DE LA BANDERA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO "NELLY AGUIRRE CARDENAS".



**PARTICIPACIÓN EVENTO DE GRADUACIÓN INICIAL EN LA ESCUELA
“ELOY ALFARO” DEL SITIO VALLE HERMOSO.**



CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES POR CUMPLIR 27 AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN DE BELLAMARIA.





CELEBRACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD PARA LOS NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.
